


## Bauvorhaben Marktgasse

Geplante organisatorische und zeitliche Abwicklung des Bauvorhabens sowie Regelung des Fußgängerverkehrs

## Bauabwicklungsplan

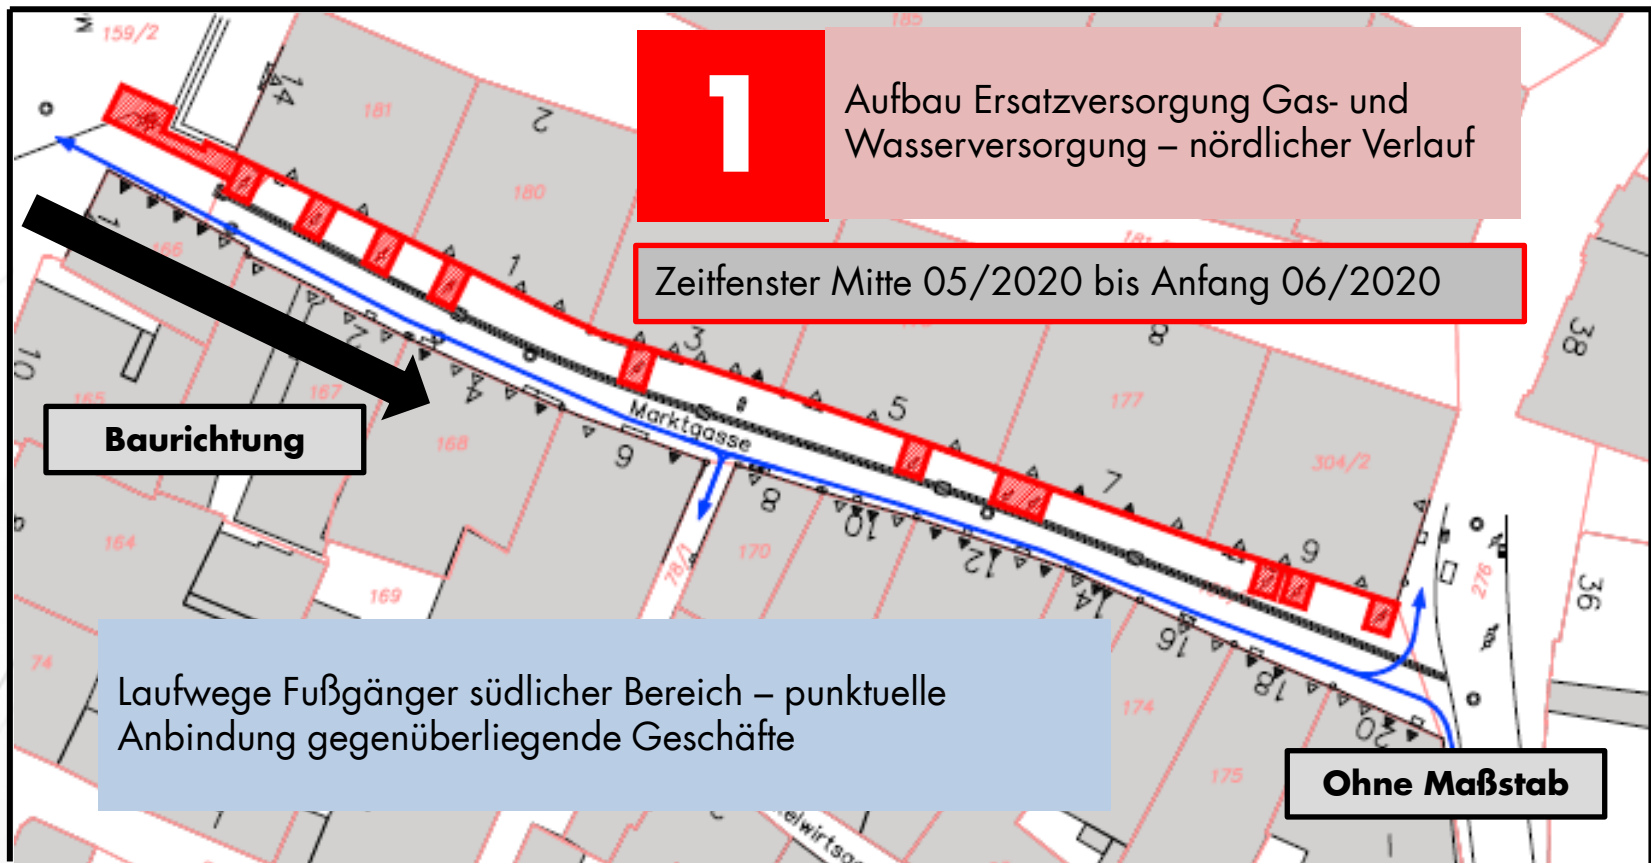

## Bauabwicklungsplan

**2**

Sanierung Kanalsammler, Erneuerung Kanalhausanschlüsse Nord, Erneuerung Gas und Wasser inkl. Hausanschlüsse Nord und Süd

Zeitfenster Anfang 06/2020 bis Ende 07/2020

Zeitfenster Anfang 02.06.2020 bis 12.06.2020

**Baurichtung**

Laufwege Fußgänger südlicher Bereich – punktuelle Anbindung gegenüberliegende Geschäfte

**Ohne Maßstab**

## Bauabwicklungsplan

Laufwege Fußgänger nördlicher Bereich Asphaltprovisorium  
– punktuelle Anbindung gegenüberliegende Geschäfte

**Baurichtung**


**3**

Erneuerung Kanalhausanschlüsse Süd,  
Erneuerung Niederspannungskabel inkl.  
Hausanschlüsse

Zeitfenster Anfang 08/2020 bis Ende 09/2020

**Ohne Maßstab**

## Bauabwicklungsplan

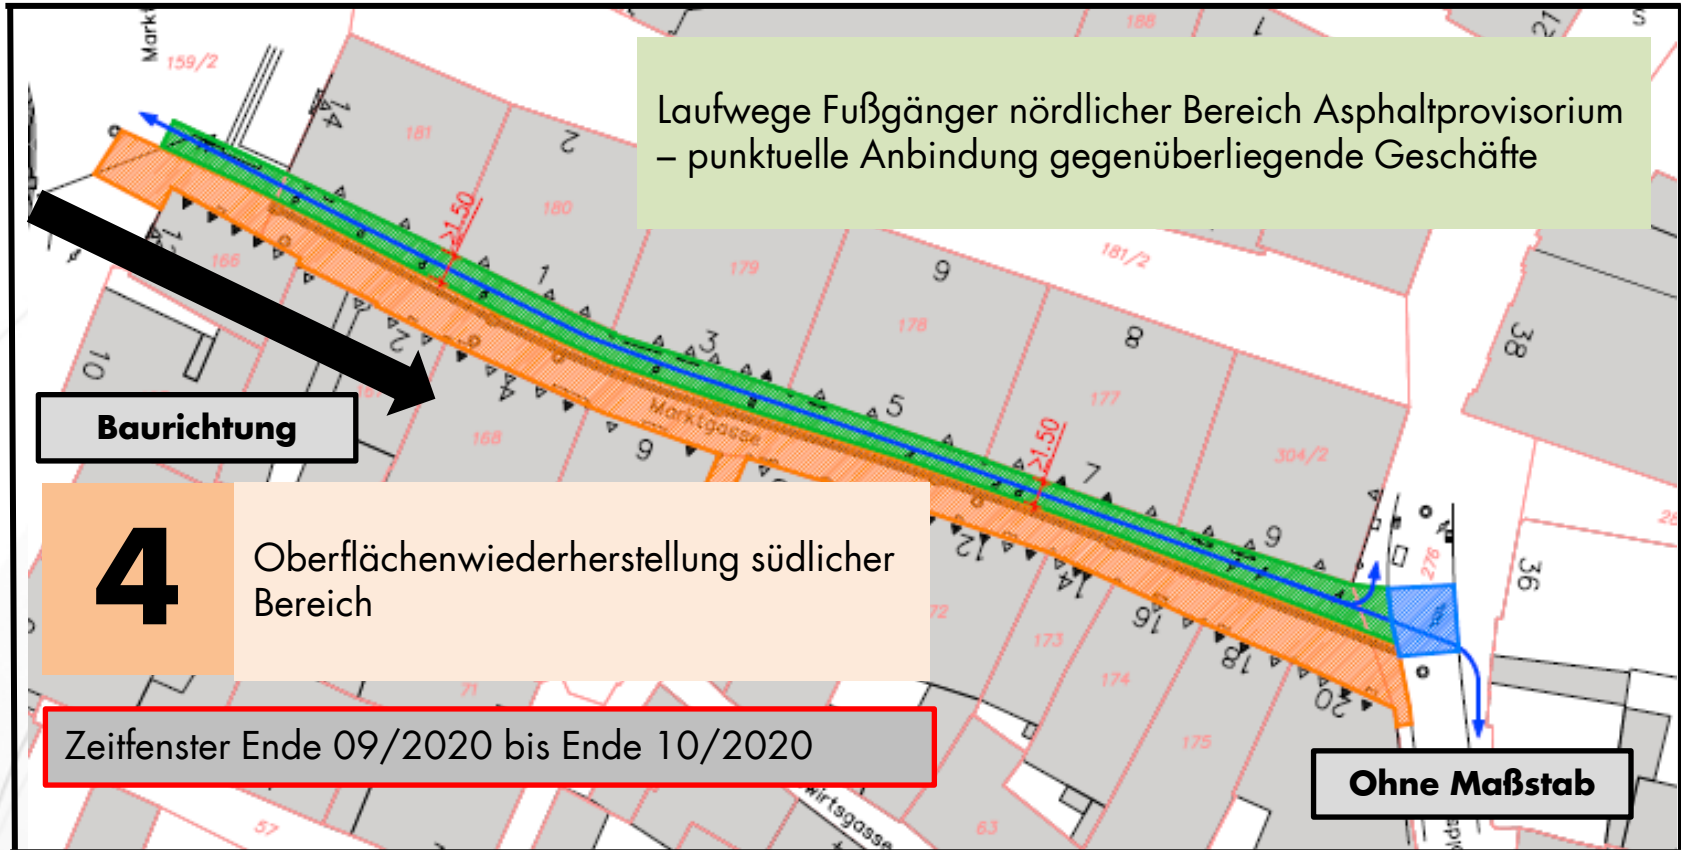

## Bauabwicklungsplan

